

Dossier d'avancement

FASHION DAY

Nathan BALLESTEROS - Timothé FLIPO - Clara KENIG - Mamadou
KOITA - Oscar ROUSSET - Jules TADEJ - Jiacheng ZHU

16 décembre 2024



Sommaire

Introduction	3
I- Présentation synthétique et structurée du projet	3
I- A) Axes privilégiés	3
I- B) Hypothèses vérifiées et non vérifiées	5
I- C) Difficulté rencontrés	7
I- D) Bibliographie et sitographie	8
II- L'état d'avancement du projet	9
II- A) Bilan des recherches réalisées	9
II- B) Les démarches entreprises	10
II- C) Les réalisations intermédiaires du projet Fashion Day	12
III- Planification des étapes à venir	14
IV - Répartition du travail	17
Communication : Jules / Clara / Timothé	17
Communication opérationnelle : Mamadou	18
Logistique : Nathan / Oscar	18
Partenariat :	19

Introduction

Inspiré par la Fashion Week de septembre 2024 à Paris, nous avons décidé d'organiser le Fashion Day. Contrairement aux défilés traditionnels, souvent considérés comme exclusifs, le Fashion Day est pensé pour toucher un public plus large : spectateurs, mannequins et jeunes créateurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés.

Lors de discussions avec des étudiants de l'IUT, nous avons remarqué que beaucoup considéraient les défilés comme inaccessibles, même pour les passionnés. Pour les créateurs de l'IUT, c'est une occasion de montrer leur travail et de se faire connaître. Dans une filière qui ne touche pas au domaine de la mode, cet événement leur permet de vivre leur passion pendant une journée à l'IUT. Pour les spectateurs, c'est un moment de découverte et de soutien aux talents locaux, dans un cadre bienveillant.

Ce Fashion Day se distingue par sa simplicité. Il n'y a pas de thème imposé : chaque créateur peut présenter ses plus belles tenues, selon son propre style. Nous voulons avant tout mettre en avant les talents de l'IUT en priorisant les créateurs de notre établissement.

Dans ce dossier, nous reviendrons sur l'évolution de ce projet, depuis son idée de départ jusqu'aux étapes concrètes de sa réalisation. Nous aborderons les démarches entreprises, l'état d'avancement actuel, les actions encore à mener, et enfin, un bilan individuel de notre implication dans cette aventure.

I- Présentation synthétique et structurée du projet

I- A) Axes privilégiés

Face à un retard dans les premières étapes, nous avons adopté une méthode de travail intensive en organisant un sprint de trois semaines. Cette période a permis de structurer notre avancée et d'identifier des priorités claires. Dans cette partie nous allons donc évoquer tous les axes de travail que nous voulions privilégier durant ce sprint.

D'abord, nous voulions nous concentrer sur la recherche de créateurs, élément clé pour garantir la faisabilité du projet. Ce travail a impliqué la diffusion d'un appel à candidatures via nos réseaux, et à de la prospection via nos contacts directs pour trouver des créateurs proches de nous. En parallèle, il a fallu lancer une campagne de recrutement de mannequins, en ciblant particulièrement les étudiants de l'IUT intéressés par une première expérience sur scène.

Un autre aspect fondamental du projet sur lequel il fallait travailler est la définition de la raison d'être de notre projet. Autrement dit, quels sont les objectifs du Fashion Day. En effet, sans cela il est compliqué de convaincre les personnes à participer à celui-ci. Ainsi, nous souhaitons non seulement offrir une visibilité accrue à de jeunes créateurs, mais également permettre à des mannequins amateurs de vivre une expérience valorisante. Toutefois, plusieurs éléments restent à clarifier, notamment le format du défilé. Effectivement, faut-il organiser l'événement autour de plusieurs thèmes distincts ou se

concentrer sur une mise en avant unifiée des créations des participants ? Pour l'instant, notre objectif est de promouvoir les créations des étudiants, donc il n'y a pas de thème(s) imposé(s).

Ensuite, la communication sur les réseaux sociaux représente un axe important afin de se rapprocher de notre public cible, les étudiants de l'IUT. Durant ce sprint, nous nous étions alors fixé l'objectif de créer notre compte Instagram, accompagné de son logo et de l'ensemble de la direction artistique. Nous avons ensuite travaillé à la conception de supports comme des flyers et des affiches (*annexe n°1*), qui serviront à promouvoir l'événement et à recruter des créateurs et des mannequins. Une présence active sur les réseaux sociaux a également été initiée pour interagir directement avec notre audience et susciter l'intérêt. Pour cela il fallait mettre en place des stories avec des sondages, car comme nous avons pu le remarquer dans d'autres SAÉ, les sondages sont la solution la plus efficace pour établir un contact avec notre cible. Enfin, il fallait accentuer le bouche-à-oreille, en sollicitant les étudiants et le personnel pour relayer nos messages au sein de l'IUT.

Un quatrième axe à privilégier était d'évaluer l'intérêt du public pour ajuster nos stratégies. Pour cela, nous voulions organiser un premier micro-événement au sein de l'IUT. Cette animation inclut une table et un panneau d'affichage où nous présentons le projet et échangeons avec les étudiants. Nous avons également prévu une activité ludique comme un jeu interactif consistant à deviner si une tenue est issue du luxe ou d'un article à bas prix (sur la base d'une photo tirée au hasard dans une boîte). Ce moment vise à créer une complicité avec le public tout en introduisant le concept du défilé, et récolter leurs avis.

Enfin, lors de l'élaboration du programme de notre sprint, nous avons évoqué l'idée d'entamer des discussions avec le Bureau des Arts notamment pour établir un partenariat. Leur soutien pourrait non seulement renforcer la visibilité de notre événement via leurs réseaux, mais également nous offrir un appui logistique et organisationnel précieux. Cette collaboration potentielle est une opportunité pour élargir l'impact et l'envergure du projet.

Tous ces axes de travail à privilégier ont constitué la majeure partie du programme de notre sprint, et continuent d'être aujourd'hui des sujets importants sur lesquels nous devons encore nous concentrer.

Annexe n°1 :



I- B) Hypothèses vérifiées et non vérifiées

Dans le cadre de notre projet, plusieurs hypothèses ont été formulées pour guider nos actions et anticiper les potentiels défis. Certaines ont été validées grâce à des retours concrets et des résultats positifs, tandis que d'autres demeurent incertaines ou nécessitent des ajustements. Cette partie vise à analyser ces hypothèses, les confronter aux réalités rencontrées, et proposer des mesures de gestion des risques pour sécuriser la réussite de l'événement.

Les hypothèses validées :

Certaines hypothèses ont été validées comme un faible engagement lors des sondages sur les groupes WhatsApp de la promotion. En effet, les premiers sondages réalisés ont confirmé une faible participation dans la recherche de participants, ce que nous avions imaginé dès lors que nous les avons préparés. Nous avons tout de même laissé le bénéfice du doute, mais nous avons obtenu seulement six réponses. Ce constat nous a donc poussés à intensifier nos efforts en communication et à diversifier les canaux utilisés pour atteindre notre public cible, notamment via Instagram où nous avons posé les mêmes questions. Ce fut concluant, car en l'espace d'une journée, nous avons déjà une cinquantaine de réponses.

Un autre constat positif, en lien avec le premier et la stratégie d'amplification de la communication via les réseaux sociaux, les affiches et nos rencontres avec les étudiants, s'avère indispensable. Cette hypothèse est validée par l'augmentation d'intérêt mesurable après des actions ciblées. En l'espace d'une journée seulement, nous avons réussi à recueillir une cinquantaine de réponses à nos sondages sur Instagram, confirmant ainsi l'efficacité de nos actions ciblées.

Une autre hypothèse validée au cours de l'avancement du projet est que les premiers échanges avec des créateurs et mannequins locaux se sont révélés très encourageants. Leur enthousiasme pour l'événement, ainsi que leur disposition à prêter des tenues, démontre que ce partenariat est réalisable et

bénéfique. Ces retours positifs valident l'idée finale d'impliquer des talents locaux comme partie intégrante de notre projet.

Un autre élément déterminant qui a été validé est la formalisation des accords. L'envoi de messages sur les canaux dédiés, la signature de contrats, et les relances régulières sont cruciaux pour garantir l'engagement des créateurs et mannequins. En parallèle, la mise en place d'une liste supplémentaire de créateurs à contacter en cas de désistement s'inscrit dans cette logique de préparation nécessaire. Cette mesure de prévention, à faire impérativement, permet de minimiser les risques d'imprévus et d'assurer une continuité même en cas de désistements imprévus de créateurs ou de mannequins. Ces deux approches, complémentaires, apportent une assurance et renforcent la fluidité de l'organisation du projet.

Les hypothèses non validées :

Une hypothèse pour laquelle nous manquons encore de certitudes est l'incertitude sur la mobilisation du public lors de l'événement final. La participation (présence) reste donc un enjeu crucial. Pour pallier ce risque en vue de l'événement, il serait nécessaire d'avoir une communication irréprochable, en mettant toutes les cartes de notre côté afin d'attirer notre public cible. En cas de faible participation, il sera aussi important de pré établir un plan B. Des solutions telles que l'adaptation du format de l'événement ou une réduction de son échelle pourront être envisagées pour garantir une expérience de qualité et maintenir l'intérêt des participants.

Un point d'incertitude qui persiste concerne une éventuelle faible participation nécessitant une flexibilité logistique. Des solutions comme l'adaptation du format ou une réduction d'échelle doivent être envisagées pour maintenir la qualité de l'événement.

Un enjeu majeur qui n'a pas encore été vérifié est l'absence de créneaux, ce qui pourrait affecter gravement la logistique. Cela souligne donc l'importance de réserver et de sécuriser les espaces nécessaires dès que possible avec M. Teddy DELOYE.

Le financement reste un point important qu'il faudra absolument résoudre pour l'événement. Faire de la prospection auprès d'entreprises qui pourraient financer ou bien nous donner des goodies pour l'événement serait une option. Nous pourrions également, dans la mesure du possible, proposer une billetterie symbolique dont les fonds seraient reversés à des associations étudiantes. Cela pourrait stimuler l'intérêt de participation des étudiants et compenser les éventuelles contraintes budgétaires.

L'un des risques identifiés, mais non encore pleinement évalués, concerne l'idée de proposer des thèmes pour les tenues lors du défilé. L'objectif initial était que chaque participant choisisse une tenue en fonction d'un thème défini, mais cette hypothèse n'a pas encore été invalidée. Cependant, la possibilité d'introduire des thèmes reste envisageable. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre de décision définitive à ce sujet. Nous avons besoin d'avoir la liste complète des créateurs et des pièces disponibles pour le défilé afin de déterminer si nous pourrions effectivement proposer différents thèmes lors de l'événement.

En termes de logistique, nous ne maîtrisons pas encore le matériel mis à disposition dans l'amphithéâtre. Il sera donc impératif de le réserver pour harmoniser l'environnement et faire des tests de ce dont nous aurons besoin, comme le micro, le son, l'éclairage, le vidéoprojecteur, etc., afin de valider cette hypothèse.

Pour pallier toutes ces hypothèses non validées, il sera impératif d'anticiper tous les imprévus pouvant nuire à notre projet. Il est donc crucial de renforcer notre gestion des risques grâce à différentes actions :

Tout d'abord, une communication accrue est essentielle pour maximiser la portée de l'événement. Cela

Par ailleurs, une organisation stricte sera indispensable. En instaurant un calendrier précis, avec des échéances à court et moyen termes, nous pourrions assurer une coordination fluide entre les membres de l'équipe et limiter les risques de retards. De plus, un soutien technique solide sera nécessaire.

Annexes :



7

Nous avons d'abord le recrutement de Créateurs et de Mannequins où nous avons rencontré des difficultés à les trouver au sein de l'IUT. Les étudiants, souvent déjà pris par leurs cours et d'autres activités, hésitent à s'impliquer dans des activités périphériques. De plus, nous avons un établissement spécialisé dans l'éducation des technologies, les élèves ne sont, pour la plupart, pas issus du domaine de la mode, ce qui complique nos recherches. Cette situation nous a obligés à envisager d'élargir nos recherches à des participants extérieurs à l'établissement.

En suite des difficultés de Financement car la recherche de sponsors s'est révélée être complexe. De nombreuses entreprises locales se montrent indécises à investir dans des projets étudiants en raison d'un manque de garanties sur la visibilité offerte et le retour sur investissement. Malgré nos efforts, les réponses positives ne sont pour l'instant pas encore arrivées, ce qui a un impact sur la planification des dépenses

De même, des difficultés de communication se sont avérées. Bien que les réseaux sociaux soient un outil essentiel pour la promotion d'un événement, et nous avons eu des résultats y concernant, nous avons quand même été confrontés à plusieurs obstacles pour capter l'attention d'un public cible comme notamment notre compte Instagram qui a été bloqué pendant un moment en raison d'un très grand nombre d'abonnement effectués. Nous avons aussi souhaité réaliser des micro-événements au sein de L'IUT afin de faire connaître notre événement mais ce projet n'a pour l'instant pas encore abouti mais ce sujet sera abordé dans la suite.

Des difficultés logistiques nous ont été causés en raison d'une incertitude sur la date exacte de l'événement, Nous avons eu des problèmes de logistique comme la réservation de l'amphithéâtre qui a constitué un premier obstacle majeur. Nous avons rencontré des délais dans l'obtention de confirmations de disponibilité des espaces requis comme pour notre micro-événement. Cette situation a mis en évidence la nécessité de commencer ces démarches encore plus tôt dans les futurs projets.

Pour finir la gestion des situations Inattendues car des imprévus peuvent survenir le jour de l'événement, comme les intempéries, des retards ou des absences imprévues. Ces scénarios n'étaient pas toujours anticipés lors de la planification initiale comme par exemple dans notre plan initiale, le défilé était prévu à l'extérieur, mais nous avons finalement opté pour l'intérieur en cas d'éventuelle pluie

La gestion d'urgence nécessite une planification et des scénarios alternatifs pour chaque étape clé à notre réussite.

Ces difficultés sont une opportunité pour notre équipe de développer ses compétences en gestion de projet, en communication et en coordination. En tirant parti de ces défis, nous serons en mesure de mieux anticiper les obstacles dans nos futures initiatives et de poser les bases d'une organisation plus efficace, tout en renforçant la cohésion de l'équipe.

I- D) Bibliographie et sitographie

Articles pour la création d'un défilé de mode :

<https://atelierdemarcmeurin.fr/guide-etape-par-etape-pour-organiser-un-defile-de-mode-avec-succes/>

<https://billetterto.fr/blog/5-astuces-cles-pour-lorganisation-dun-defile-de-mode>

<https://www.festivalcallinet.fr/actu/5/comment-reussir-lorganisation-d-un-defile-de-mode>

<https://weezevent.com/fr/blog/organiser-defile-mode/>

Articles concernant la logistique d'un défilé de mode :

https://www.ctn-event.com/fr/fr_FR/page//evenements/decoration-defile-de-mode

Vidéos d'exemple de défilé de mode :

<https://youtu.be/XOlkoj9tmQk?si=PssZ4LRoMzNugx7M>

<https://youtu.be/4q5e91c5j-I?si=0WO-7cdY5eQttdyb>

<https://youtu.be/DyJpFmfA1Og?si=x-LOncmmkzQ4tAv4>

<https://youtu.be/0JQgfX1-3Go?si=912rVUJZrkqdnMuD>

<https://youtu.be/pSUIpwsqc8?si=XUIgW61BsqRoKLHj>

II- L'état d'avancement du projet

II- A) Bilan des recherches réalisées

L'une des premières étapes de notre recherche a été de définir les besoins logistiques pour organiser un défilé de mode au sein de notre IUT. Nous avons exploré différentes options pour l'emplacement et les équipements nécessaires à un événement de cette envergure.

Pour le lieu de l'événement nous avons choisi l'amphithéâtre de l'université, idéalement situé pour accueillir le public et les créateurs. Nous avons également recherché une autre salle sous l'amphithéâtre pour exposer les créations des créateurs après le défilé.

En ce qui concerne le matériel requis après avoir étudié des exemples d'événements similaires, nous avons déterminé qu'un micro et des enceintes seraient nécessaires pour la sonorisation de l'événement. Nous avons également étudié les besoins en éclairage et en supports pour les tenues. Nous continuons à analyser les meilleures options pour l'équipement et à évaluer les coûts.

Ensuite une partie de notre recherche a consisté à déterminer comment collaborer efficacement avec des créateurs issus de notre université, souvent non spécialisés dans le domaine de la mode. Nous avons réfléchi à la manière de promouvoir une diversité de styles tout en assurant la qualité et la cohérence de l'événement.

Nous avons pris la décision de faire appel aux créateurs de l'IUT pour valoriser les talents locaux, même ceux qui ne sont pas issus des filières de mode. Cela nous a permis de découvrir des créateurs avec une grande variété de styles, allant du design à l'art plastique, enrichissant ainsi la créativité de l'événement.

Afin d'apporter le support optimal aux créateurs, nous avons étudié les besoins des créateurs en termes de matériel (portants, espace d'ajustement, assistance) et d'organisation pour les aider à se préparer dans de bonnes conditions. Les retours de certains créateurs nous ont permis de mieux définir ces besoins logistiques, et nous allons continuer à les affiner au fur et à mesure de nos échanges.

Un autre aspect essentiel de l'organisation d'un défilé est la sélection des mannequins. Nous avons cherché à comprendre les critères essentiels pour avoir des mannequins impliqués et motivés, et comment gérer l'aspect logistique lié à leur préparation.

Nous avons lancé un sondage pour recruter des mannequins parmi les étudiants de l'IUT, ce qui nous a permis d'avoir des retours de personnes intéressées. Ce groupe n'est pas professionnel, mais il est enthousiaste et représente une partie intégrante de notre université. Nous avons aussi envisagé l'option d'inviter les Créateurs à apporter leurs propres mannequins en complément des étudiants.

Pour ce qui est de la préparation, nous avons recherché des conseils pour organiser la préparation des mannequins, y compris le choix des tenues, les répétitions et les soins logistiques liés à leur participation. Ensuite, nous avons cherché à identifier les attentes et besoins des spectateurs pour nous assurer que l'événement répondra à leurs attentes. Grâce à un sondage, nous avons exploré l'intérêt et les attentes des étudiants pour mieux cerner le public visé.

Notre public ciblé sont les étudiants ont montré un fort intérêt pour l'événement, ce qui confirme l'importance de maintenir une communication fluide. Nous avons aussi étudié les meilleures pratiques pour maintenir l'enthousiasme autour de l'événement, en créant une hype avant la date du défilé.

Pour ce qui est de la scénographie et du déroulement, l'une des préoccupations majeures a été de définir les éléments essentiels pour que le défilé soit réussi, au-delà des créateurs et mannequins. Nous avons cherché des informations sur les aspects clés de la scénographie pour garantir une ambiance réussie et professionnelle.

Ensuite, nous avons cherché à comprendre quels types de musique et d'ambiances fonctionnent le mieux pour accompagner un défilé. Plusieurs styles musicaux ont été proposés, et nous avons commencé à planifier une playlist variée qui pourrait correspondre à la diversité des créations.

Nous avons aussi recherché les meilleures pratiques pour organiser l'ordre des passages des créateurs et des mannequins, afin de garantir un défilé fluide et dynamique.

Grâce à nos recherches nous avons constaté que la communication est cruciale pour assurer la visibilité de l'événement. Nous avons étudié différentes stratégies pour promouvoir l'événement auprès des étudiants, à la fois en ligne et hors ligne.

Nous avons décidé de promouvoir l'événement à travers des affiches visibles dans l'IUT, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Les retours sont positifs et montrent un intérêt croissant. Nous avons étudié l'importance d'une communication régulière pour maintenir l'enthousiasme et accroître la participation.

II- B) Les démarches entreprises

Afin d'organiser au mieux notre événement, nous avons entrepris plusieurs démarches en mobilisant différents acteurs et en utilisant divers outils. Nous avons voulu mettre en place des actions concrètes pour structurer le projet de manière efficace et répondre aux besoins spécifiques de chaque étape. L'objectif était de coordonner l'ensemble des tâches, d'assurer une communication fluide avec les parties prenantes et d'anticiper les imprévus.

Nous avons tout d'abord contacté le BDA via les réseaux sociaux. L'objectif était d'obtenir des informations pratiques sur les aspects logistiques, comme la disponibilité de matériel (micros, enceintes,

etc.), mais aussi de savoir si des créateurs ou des ressources pouvaient être mobilisés au sein de l'association pour contribuer à l'organisation de l'événement.

Ensuite, la recherche de créateurs représente une étape clé, mais également un défi pour nous. En effet, au début du projet, nous avons accumulé du retard, car nous avons eu des difficultés à trouver suffisamment de créateurs au sein de l'IUT. Nous avons utilisé plusieurs méthodes, notamment le bouche-à-oreille, qui a été le plus efficace. Une fois les créateurs identifiés, nous les avons contactés directement sur les réseaux sociaux pour discuter de leurs pièces et vérifier leur disponibilité pour l'événement. Nous avons également réalisé un sondage sur Instagram pour identifier d'autres créateurs intéressés. Par la suite, des relances ont été faites auprès des créateurs pour confirmer leur participation.

La constitution d'une équipe de mannequins s'est révélée particulièrement complexe. Bien que certains créateurs aient prévu d'amener leurs propres mannequins, cela ne suffit pas à couvrir tous nos besoins. À ce jour, nous n'avons pas encore réussi à en trouver suffisamment au sein de l'IUT. Malgré nos démarches via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, nous sommes toujours en recherche active de mannequins, que ce soit au sein de l'IUT ou à l'extérieur.


De plus, attirer des spectateurs pour notre défilé est également essentiel, et nos efforts en communication commencent à montrer des résultats. Avec la diffusion d'affiches (annexe) au sein de l'IUT et une activité régulière sur Instagram, l'événement gagne peu à peu en visibilité. Ces actions attirent l'attention des étudiants. Nous avons déjà reçu des retours encourageants de la part de ceux qui souhaitent venir en tant que spectateurs. Cela montre que notre stratégie de promotion suscite de l'intérêt et contribue à rendre l'événement attrayant. Nous restons motivés pour poursuivre nos efforts et continuer à faire connaître le défilé afin de rassembler un public encore plus large.

Dans le cadre de notre communication, nous avons contacté la responsable communication de l'IUT pour valider nos supports et obtenir les autorisations nécessaires pour les diffuser. Cela nous a permis de maximiser notre campagne de communication en utilisant les canaux officiels de l'IUT.

Enfin, pour garantir le bon déroulement de l'événement, nous avons décidé de le réaliser dans l'amphithéâtre. Pour cela, nous avons pris contact avec Monsieur Deloy afin de connaître les créneaux disponibles et de réserver cet espace. Il nous a informés que l'amphithéâtre était principalement disponible les jeudis et vendredis, ce qui nous permet d'avoir une idée plus précise du jour où nous pourrions organiser notre défilé.

Bien que certaines étapes restent encore à finaliser, ces initiatives ont permis de poser des bases solides pour la réalisation du défilé. Ces démarches, parfois difficiles, nous ont aidées à avancer progressivement dans le projet, en réfléchissant constamment à des solutions adaptées pour atteindre nos objectifs.

Annexe



II- C) Les réalisations intermédiaires du projet Fashion Day

Afin de garantir le succès de notre événement, le Fashion Day, nous avons identifié que la communication joue un rôle central dans la mobilisation des participants et l'engagement du public. Dès le début du projet, nous avons élaboré une stratégie combinant des outils de communication physiques et numériques afin d'atteindre efficacement nos objectifs. Cette approche repose sur la complémentarité des supports pour maximiser notre visibilité et susciter l'intérêt d'un public large et varié.

Dans un premier temps, nous avons conçu un flyer, un outil physique essentiel pour promouvoir notre événement. Ce support a été soigneusement élaboré pour refléter l'identité visuelle du Fashion Day tout en répondant à des objectifs précis. Le flyer vise avant tout à attirer des participants, qu'il s'agisse de mannequins ou de créateurs désireux de collaborer avec nous. Il intègre également un QR code et le nom du compte Instagram de l'événement, ce qui permet aux destinataires d'accéder rapidement et facilement à notre plateforme en ligne. La distribution des flyers a été stratégiquement organisée dans des lieux fréquentés par des passionnés de mode, tels que des écoles de design, des boutiques indépendantes et des espaces culturels. Ce travail sur le terrain a non seulement renforcé notre visibilité, mais il a aussi créé une interaction directe avec des personnes susceptibles d'être intéressées par notre initiative.

En parallèle, nous avons développé une plateforme digitale, sous la forme d'un compte Instagram nommé *@fashionday_iut*. Ce compte constitue un pilier central de notre stratégie de communication en ligne. D'une part, il est utilisé comme un espace de promotion, permettant de partager des informations clés sur l'événement principal ainsi que sur les activités annexes prévues. Les publications sont soigneusement planifiées pour maintenir un engagement constant auprès de notre audience. Nous avons également conçu un logo distinctif pour renforcer l'identité visuelle et assurer la reconnaissance de notre marque. D'autre part, le compte Instagram joue un rôle actif dans le recrutement des participants. Grâce aux outils de messagerie et de publication d'Instagram, nous sommes en mesure de communiquer directement avec des mannequins et des créateurs potentiels. Ces échanges permettent non seulement de recueillir des candidatures, mais aussi de répondre aux questions et d'instaurer une relation de confiance avec nos futurs collaborateurs.

En termes de résultats intermédiaires, le compte Instagram a d'ores et déjà commencé à mobiliser une communauté autour de l'événement, bien que son développement soit encore en cours. À ce jour, nous avons obtenu un nombre croissant de followers, signe d'un intérêt progressif pour le projet. Par ailleurs, les interactions via les réseaux sociaux nous ont permis de recevoir plusieurs candidatures de mannequins et de créateurs intéressés. Ces résultats témoignent de l'efficacité de notre stratégie digitale et de son impact sur le recrutement. De même, la distribution des flyers a généré un retour positif de la part des destinataires, certains ayant directement contacté notre équipe via le QR code intégré.

Ces actions, tant physiques que numériques, forment une base solide pour assurer la réussite du Fashion Day. Elles traduisent une étape essentielle dans la mise en œuvre de notre projet, en établissant un lien direct avec notre public cible tout en renforçant la visibilité de notre événement. À mesure que nous progressons, ces outils continueront d'être optimisés pour maximiser leur efficacité et garantir un défilé mémorable, tant pour les participants que pour le public.

Pour que ces éléments soient efficaces, il a fallu les mettre en place, d'où l'organisation de l'événement annexe : « Fashion Day à la rencontre de l'IUT ». Cet événement avait pour objectif de démocratiser davantage notre projet et d'impliquer directement les étudiants et le personnel de l'IUT. Cette initiative a permis d'établir un contact direct avec un large public au sein de l'établissement, en s'appuyant sur une approche interactive et dynamique.

La mise en place de cet événement a nécessité la création d'un questionnaire interactif conçu pour engager les interlocuteurs et susciter leur intérêt pour le Fashion Day. Ce questionnaire a été structuré en deux parties : une première partie générale destinée à mettre à l'aise les participants en discutant de leur rapport personnel avec la mode, et une seconde partie plus concrète visant à identifier leur intérêt pour participer au projet, soit en tant que mannequins, soit en tant que créateurs. Le questionnaire permettait également de savoir si les participants connaissaient des personnes susceptibles d'être intéressées par l'événement.

Le déroulement de l'événement s'est articulé en deux temps. Dans un premier temps, les membres de notre équipe se sont répartis en binômes et sont intervenus dans les différentes salles de l'IUT, ciblant les groupes travaillant sur place. Un membre du binôme présentait un pitch du projet tandis que l'autre distribuait des flyers contenant un QR code redirigeant vers notre compte Instagram. Cette approche a permis de capter l'attention d'un maximum de personnes en un temps limité, tout en renforçant la notoriété de notre plateforme digitale.

Dans un second temps, chaque membre du binôme engageait un échange individuel avec les personnes présentes dans les salles. Ces interactions ont permis d'approfondir les discussions autour du questionnaire élaboré en amont. Cette étape visait à établir une relation de proximité avec les participants et à les encourager à partager leurs expériences et leur intérêt pour le Fashion Day.

Les résultats obtenus de cette opération ont été particulièrement encourageants. Lors de cet événement annexe, nous avons pu interagir avec 60 personnes, ce qui a conduit à une augmentation notable de 57 abonnés sur notre compte Instagram. Bien que l'objectif principal de recruter des participants pour le défilé ait rencontré un succès mitigé – avec un mannequin trouvé mais aucun créateur identifié – cette initiative a permis de renforcer significativement la visibilité de notre projet au sein de l'IUT et d'établir un contact direct avec notre public cible.


Ainsi, cette opération s'inscrit comme une étape clé dans la stratégie globale du Fashion Day. Elle a non seulement permis de faire connaître notre initiative à un large public, mais elle a également contribué à renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et à établir une dynamique positive autour de l'événement. En capitalisant sur ces premiers résultats, nous envisageons d'organiser d'autres initiatives similaires pour continuer à promouvoir le Fashion Day et élargir notre base de participants.

Annexes :



Mannequin contact

14 réponses



III- Planification des étapes à venir

Voici la planification des étapes de notre projet qui se dérouleront sur tout le semestre 4 jusqu'au défilé qui aura lieu le jeudi 22 mai :

Mars

Au mois de mars se déroulera l'organisation des premières étapes :

Lundi 17 mars :

- Échanges avec l'administration de l'IUT pour réserver l'amphithéâtre (lieu du défilé) pour le 22 mai.

- Proposition d'organiser un premier événement annexe afin de mobiliser et promouvoir l'événement.

Lundi 24 mars :

- Préparation de cet événement annexe 1 axé sur la promotion du défilé. Cela inclut des supports de communication et la planification des animations.

Lundi 31 mars :

- Organisation de l'événement (*annexe*), comprenant la distribution de flyers pour maximiser la visibilité mais aussi des jeux interactifs autour de la mode pour engager les participants et un goûter pour inciter à se renseigner sur le défilé.

Avril à mai

Au mois d'avril et de mai, auront lieu les derniers préparatifs avant le défilé.

Lundi 28 avril :

- Fixation du prix pour le(s) gagnant(s) du concours organisé lors du défilé.
- Vérification des éléments essentiels pour le bon déroulement : sonorisation, éclairages, décoration (notamment le tapis rouge).
- Demande auprès de l'administration pour organiser un deuxième événement annexe.

Lundi 5 mai :

- Préparation de l'événement (*annexe*) sous forme de mini-shop, qui servira à promouvoir davantage l'événement en montrant un aperçu des tenues.
- Renforcement de la stratégie de communication via les réseaux sociaux (notamment Instagram) et des affiches.

Lundi 12 mai :

- Organisation du mini-shop événement (*annexe*) : mise en avant de quelques tenues pour attirer davantage de participants au défilé.

Lundi 19 mai :

- Réalisation des dernières préparations : vérification des aspects techniques, finalisation des tenues et échanges avec les participants.

Jeudi 22 mai : Jour du défilé

Le défilé se déroulera sous un planning précis :

Matinée :

- Accueil des créateurs à l'IUT, suivi de leur préparation.
- Installation dans l'amphithéâtre avec des tests techniques (son et éclairages).
- Accueil du public dans une ambiance festive et professionnelle.



Début d'après-midi :

- Début du défilé avec présentation des créateurs, puis le passage des tenues sur scène.
- Remise des récompenses aux gagnants.

Après-midi :

- Après la sortie du public, préparation d'une exposition des tenues et accessoires.
- L'exposition se tiendra dans une salle sous l'amphithéâtre pour permettre un dernier moment de découverte.

Annexes :

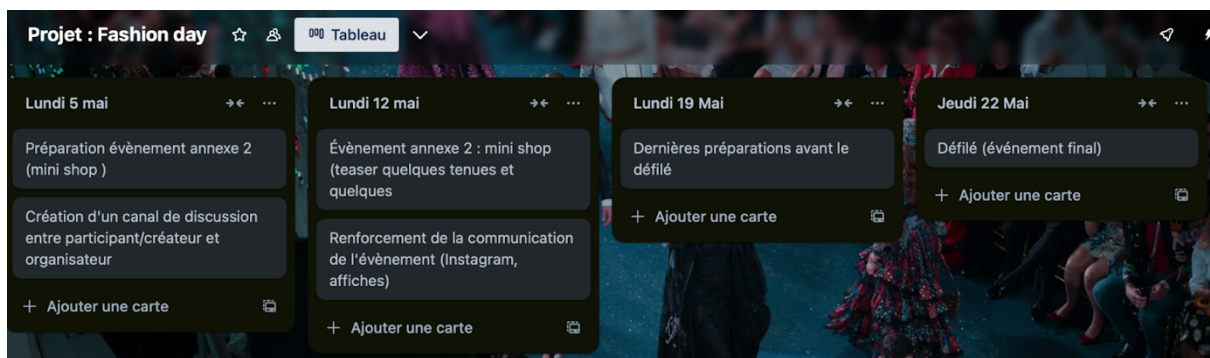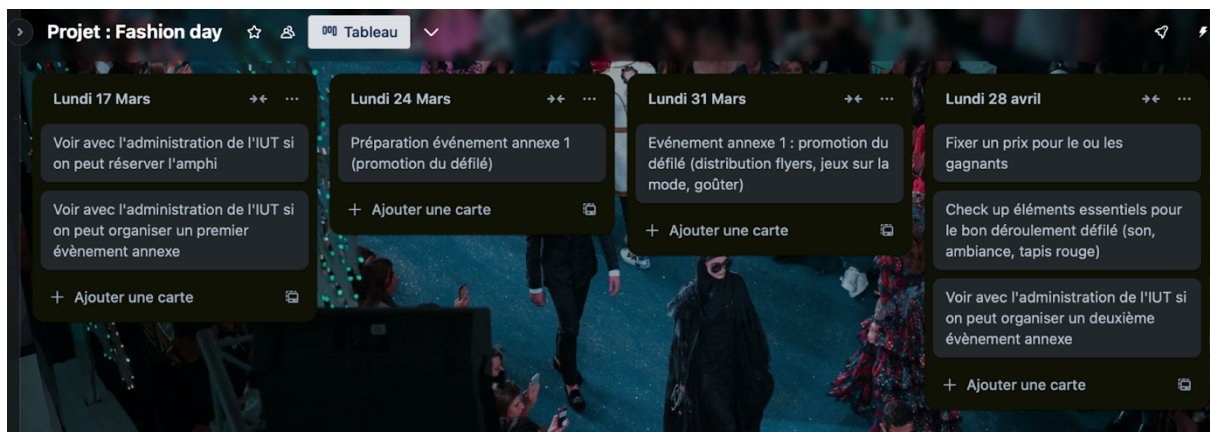

Heure	jeudi 22 mai	Lieu
8h30-9h	Arrivée IUT	A déterminer
9h-10h	Arrivée et accueil des créateurs	A déterminer
10h-12h	Préparation des créateurs	A déterminer
12h-12h30	Installation dans l'amphi et test enceintes/éclairages	Amphi
12h30-12h40	Accueil du public dans l'amphi	Amphi
12h40-12h50	Présentation créateurs	Amphi
12h50-13h00	Défilé	Amphi
13h00-13h10	Récompenses	Amphi
13h15-13h30	Sortie du public et rangement matériel	Amphi
13h30-14h	Préparation exposition pièces	salle sous amphi
14h-17h	Exposition pièces	salle sous amphi

IV - Répartition du travail

Communication : Jules / Clara / Timothé

Timothé FLIPO :

Dans le cadre de l'avancement du projet, j'ai principalement contribué à la partie I-A) Axes privilégiés. Mon travail consistait à organiser et coordonner les activités de groupe en élaborant les plans détaillés pour les différents rendus, tels que la fiche synthèse, le cahier des charges, ou encore le dossier d'avancement. J'ai également supervisé l'avancée des tâches de chaque membre et mis en place des outils collaboratifs comme Notion, afin de structurer notre travail de manière efficace.

J'ai participé à la création des supports visuels en proposant une direction artistique pour le projet, puis avec l'équipe, nous avons conçu le logo. J'ai également travaillé sur une quinzaine de versions de l'affiche et des flyers pour sélectionner la plus adaptée (annexe n°1), et réalisé la page de garde du dossier.

Face aux imprévus, j'ai contribué à structurer un sprint permettant de rattraper le retard accumulé, avec des étapes claires et définies. J'ai participé à l'organisation d'un micro-événement visant à recruter davantage de créateurs et de mannequins. J'ai aussi proposé et intégré de nouveaux outils, notamment en créant un espace de travail sur Notion (annexe n°2), tout en collaborant avec Jules et Clara à la gestion du compte Instagram et à la réalisation de sondages en story.

Enfin, ce projet m'a permis de développer mes compétences en gestion de projet et en prise de décision, tout en renforçant ma capacité à gérer les priorités dans un cadre structuré et collaboratif.

Jules TADEJ :

Au cours de ce projet, j'ai été activement impliqué dans de nombreuses missions qui ont contribué à son avancement. Tout d'abord, j'ai pris contact avec Madame Laveille pour coordonner la validation des supports de communication, tels que les affiches et le compte Instagram. J'ai également conçu une première version du flyer (V1), qui a servi de base pour élaborer notre identité visuelle. Après validation, je me suis occupé du passage à l'imprimerie et de l'affichage des affiches dans des emplacements stratégiques de l'IUT afin de maximiser leur visibilité.

Dans le cadre de la recherche de participants et de la promotion de notre projet, j'ai contribué à l'organisation d'un micro-événement. Cette initiative comprenait un contact direct avec les étudiants pour recueillir leurs retours via un sondage interactif et l'élaboration d'un Google Form pour faciliter la collecte d'informations. En parallèle, j'ai également pris en charge la gestion de la communication digitale, notamment en créant et publiant des stories sur Instagram pour promouvoir le projet et engager notre public cible.

J'ai été également à l'origine de la proposition du sujet principal, en suggérant l'idée du défilé de mode. Cette idée a été validée par le groupe et adoptée comme projet principal. Par ailleurs, j'ai participé activement, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, à toutes les échéances, incluant les soutenances et les différents rendus.

Concernant la recherche de participants, j'ai pu identifier deux créateurs grâce à mes propres contacts, dont une créatrice interne à l'IUT et un autre contact externe. En plus de ces contributions, j'ai supervisé l'avancement des tâches des membres du groupe en assurant des relances régulières pour garantir une progression collective.

Enfin, j'ai également contribué à la rédaction de la partie du dossier d'avancement concernant les hypothèses vérifiées et non vérifiées, en analysant ce qui avait fonctionné ou non dans nos stratégies.

Clara KENIG :

Dans mon groupe, ma mission principale est de m'occuper de la communication, une tâche importante pour assurer la visibilité autour du Fashion Day. Mon travail a commencé par la création du compte Instagram dédié à l'événement, ainsi que du logo qui a été reçu en groupe, afin de donner une identité visuelle à notre projet et de toucher un maximum de personnes.

J'ai également pris contact avec le Bureau des Arts (BDA) de l'IUT, une étape importante pour vérifier le matériel disponible, comme les équipements techniques nécessaires au défilé. Ces échanges ont permis de mieux planifier l'utilisation des ressources existantes. Par ailleurs, j'ai mené des démarches auprès de certains créateurs, notamment en leur envoyant des messages via Instagram pour confirmer leur intérêt à participer à l'événement et pour échanger sur leurs créations.

Dans le cadre de ma mission, j'ai aussi cherché à comprendre les attentes et les envies des étudiants de l'IUT. Pour cela, nous avons tous ensemble réalisé des interviews et un sondage auprès d'eux, afin de savoir s'ils étaient intéressés par la mode et s'ils souhaitaient s'impliquer dans le projet. Ces interviews se sont réalisées sous forme de micro-événement. Ces retours ont permis d'ajuster notre approche et de mieux cibler nos actions.

Communication opérationnelle : Mamadou

Dans le cadre du dossier d'avancement, j'ai réalisé la partie II-A) Bilan des recherches réalisées, ainsi que la partie I-D) Bibliographie et sitographie.

Au début du projet, j'ai d'abord travaillé sur la création d'un questionnaire destiné à collecter des informations auprès des étudiants intéressés par l'événement. Ce questionnaire avait pour objectif de comprendre leurs attentes, d'identifier des créateurs et des mannequins potentiels, et de récolter des idées pour enrichir l'événement, afin de m'assurer que le projet était réalisable. Une fois le questionnaire prêt, j'en ai assuré la diffusion via le groupe WhatsApp de la promotion pour toucher un maximum de personnes au sein de l'IUT.

Ensuite, j'ai participé activement à la recherche de créateurs et de mannequins potentiels, en utilisant les réseaux sociaux et en échangeant directement au sein de l'IUT. Lors d'un échange avec un créateur, je lui ai présenté le projet, ce qui m'a permis d'avoir notre premier créateur motivé et prêt à participer. Ce créateur a également proposé de ramener ses propres mannequins, et a suggéré des créateurs supplémentaires au sein de l'IUT, ainsi que des créateurs externes.

Par la suite, j'ai envoyé des messages pour confirmer l'intérêt des créateurs ayant répondu au sondage, ainsi que celui avec qui j'avais déjà échangé afin de pouvoir communiquer sur les détails du défilé. En parallèle, j'ai poursuivi la recherche de mannequins et ai trouvé une mannequin prête à participer au projet.

Logistique : Nathan / Oscar

Étant en parcours Gestion Comptabilité Financière et Fiscale (GC2F), nous avons été à l'initiative de gérer la logistique du projet de défilé de mode

Nathan BALLESTEROS :

Dans le cadre du projet universitaire, j'ai contribué à plusieurs aspects clés de l'organisation. J'ai géré le tableau des tâches sur Trello, un outil essentiel pour coordonner les membres de l'équipe et suivre l'avancement des différentes étapes. J'ai également participé à l'élaboration du financement sur Excel, ce qui a permis d'anticiper les besoins financiers et d'assurer un équilibre entre les dépenses et les ressources.

Par ailleurs, j'ai pris part à un micro-événement consistant à interviewer des étudiants pour trouver des créateurs intéressés par le projet et recueillir des avis afin d'affiner notre démarche. Je me suis également renseigné auprès de l'administration de l'IUT pour comprendre les démarches nécessaires à la réservation des amphithéâtres, ce qui a permis de garantir le lieu de l'événement. Enfin, j'ai imaginé deux activités annexes prévues au quatrième semestre : des jeux interactifs sur le thème de la mode et un mini-shop pour exposer les créations des participants, et j'ai défini les horaires et lieux du défilé final.

Ces contributions m'ont permis de renforcer mes compétences en gestion, logistique et communication tout en jouant un rôle déterminant dans la réussite du projet.

Oscar ROUSSET:

Dans le cadre du projet universitaire, j'ai apporté une contribution significative au pôle logistique en prenant en charge plusieurs missions essentielles. Tout d'abord, j'ai participé à l'élaboration du matériel nécessaire, à la création d'un tableau d'estimation budgétaire précis et à la recherche de moyens de financement adaptés pour assurer la viabilité financière du projet. J'ai également géré des démarches administratives avec M.Deloye, comme la réservation de l'amphithéâtre, indispensable au bon déroulement des activités.

En complément de mes responsabilités au sein du pôle logistique, j'ai élargi mon implication en contribuant à des tâches transversales. J'ai collaboré à l'organisation d'événements annexes, notamment en concevant un Google Form pour faciliter leur mise en place et en contribuant à leur bon déroulement. De plus, j'ai travaillé à la conception de deux futurs événements pour enrichir le projet. Enfin, j'ai mené une prospection en ligne pour identifier des créateurs susceptibles de collaborer, apportant ainsi une dimension supplémentaire au développement du projet.

Partenariat :

Jiacheng ZHU

Dans ce projet, j'ai mené la recherche des partenariats pour le financement de notre projet et des capital humains et culturels, cela concerne non seulement la recherche des créateurs externe pouvant participer à notre événement, mais aussi des mannequins et d'autre partie prenante du secteur de la mode

je m'en occupe aussi de la négociation avec des entreprise de textile et de prêt à porter pour un soutiens matériel et l'obtention d'aide de plusieurs entreprise locale pour l'élaboration de notre projet

Ce projet m'a permis de développer mes compétences dans le domaine social et de communication
